

Procédure de Gestion de l'Imprévu

Référence : BYTP-PRO-H&S-2114-vA

Entité	Domaine	Type de document	N° Séquence	Indice de révision	Langue
BYTP	H&S	PRO	2114	A	FR



BUILDING FOR LIFE

Version	Date	Rédacteur	Vérificateur	Valideur	Détails des modifications
A	04/04/2025	F.Martin	V.Avrillon	L.Knoll	Création du document

Table des matières

1.	Objectif	2
2.	Champ d'application	2
3.	Documents de référence.....	2
4.	Définitions et abréviations.....	3
5.	Responsabilités.....	3
5.1.	Directeur/Responsable de projet	3
5.2.	Valideurs	3
5.3.	Responsable Technique du projet.....	4
5.4.	Responsable Prévention Santé Sécurité	4
5.5.	Tout personnel sur site.....	5
6.	Étapes de la gestion de l'imprévu.....	5
6.1.	Identification de l'imprévu.....	5
6.2.	Sécurisation de la zone	6
6.3.	Analyse collective	6
6.4.	Niveaux de validation.....	6
6.5.	Mise en œuvre des actions	7
6.6.	Communication	7
7.	Archivage et traçabilité	7
8.	Annexes	8
8.1.	Annexe 1 - Dépliant unique de gestion de l'imprévu	8
8.2.	Annexe 2 - Poster de gestion de l'imprévu nominatif	9
8.3.	Annexe 3 - Fiche de suivi d'un imprévu de niveau 3.....	10

1. Objectif

L'objectif de ce document est d'établir une organisation claire, structurée et efficace pour gérer les imprévus pouvant survenir sur les chantiers.

Ce processus vise à identifier rapidement les imprévus, à mettre en œuvre des actions adaptées pour les gérer et à garantir une traçabilité des décisions prises lorsque cette exigence s'impose.

Il définit les critères et modalités permettant de distinguer les gestions informelles des gestions formelles, selon la classification des imprévus.

Les principes établis dans ce document s'intègrent dans les plans de management de chaque projet BYTP, en tenant compte des spécificités locales, des exigences réglementaires applicables, et des engagements contractuels.

2. Champ d'application

Ce document est applicable à l'ensemble des personnels BYTP intervenants sur les projets/sites.

Le projet/site partage avec ses prestataires et sous-traitants la culture BYTP de la gestion de l'imprévu, en particulier l'importance de la détection de l'imprévu et du STOP qui s'en suit, et peut, s'il le souhaite et si l'organisation le permet, leur faire appliquer cette procédure.

Dans le cas de projets où BYTP est en groupement (JV), SEP ou est co-traitant, la procédure spécifique du projet reprendra à minima les dispositions décrites dans ce document, ainsi que les dispositions non contradictoires de nos partenaires. Il conviendra de la faire adopter au démarrage des projets lors des lancements santé sécurité.

Dans le cas où une partie de ce document entre en conflit avec une exigence locale et est moins exigeante que cette réglementation locale, alors la ou les section(s) correspondante(s) de la réglementation locale s'appliquent.

3. Documents de référence

- Outils de la Culture Sécurité – Axe 2 Gestion de l'imprévu en sécurité
 - Dépliant unique
 - Dépliant collaborateur
 - Dépliant valideur
 - Poster bonne pratique
 - Poster acte dangereux
 - Affiche qui contacter en cas d'imprévu
- Fiche de déclaration de gestion de l'imprévu (BYTP-H&S-FOR-2115)

4. Définitions et abréviations

Imprévu	Un imprévu est un événement ou une situation inattendue perturbant le déroulement initialement prévu d'une tâche
Imprévu niveau 1	Imprévu sans impact sur les risques majeurs
Imprévu niveau 2	Imprévu ayant un impact sur les risques majeurs ou un faible impact sur la documentation technique
Imprévu niveau 3	Imprévu ayant un impact conséquent sur la documentation technique (dimensionnement, conception, méthodes)

5. Responsabilités

5.1. Directeur/Responsable de projet

Le Directeur/Responsable de projet assure le traitement structuré et efficace des imprévus qui pourraient survenir sur son projet. Ses responsabilités incluent :

- La mise en place, la compréhension et l'application de la gestion des imprévus conformément aux modalités définies dans ce document
- La coordination des moyens techniques et humains nécessaires
- La validation des actions à entreprendre pour les imprévus de niveau 3, ayant un impact conséquent sur la documentation technique du projet (dimensionnement, design ou méthodes).
- La validation, s'il le juge nécessaire, des actions pour les imprévus de niveau 2, qui ont un impact mineur sur la documentation technique.
- Collaborer avec le Responsable Prévention Santé Sécurité pour s'assurer du respect des protocoles et bonnes pratiques de gestion des imprévus.

Pour les grands projets et en fonction de l'organisation en place, le Directeur/Responsable projet peut, s'il le souhaite, déléguer à sa ligne managériale ses responsabilités de valideur.

5.2. Valideurs

Les valideurs, désignés par le Directeur/Responsable de projet, interviennent dans la gestion des imprévus selon trois niveaux, en fonction de leur impact.

Responsabilités générales des valideurs :

- S'assurer que leurs équipes comprennent la gestion des imprévus et appliquent ses principes
- Informer le management du projet en fonction du niveau de l'imprévu
- Superviser et garantir l'application effective des actions décidées

- Collaborer avec le Responsable Prévention Santé Sécurité pour s'assurer du respect des protocoles de gestion des imprévus.

Valideur de niveau 1

- Traite les imprévus n'ayant pas d'impact sur les risques majeurs
- Peut valider la reprise d'activité après mise en place des mesures adaptées

Valideur de niveau 2

- Traite les imprévus ayant un impact sur les risques majeurs ou un faible impact sur la documentation technique
- Coordonne les échanges nécessaires pour analyser et solutionner la situation
- Valide les mesures correctives et la reprise d'activité s'il considère que les risques sont sous contrôle

Valideur de niveau 3

- Gère les imprévus ayant un impact conséquent sur la documentation technique
- Supervise la gestion de la nouvelle approche et les modifications techniques nécessaires en lien avec le Responsable Technique du projet
- Complète et valide sa section de la *Fiche de déclaration de gestion de l'imprévu* (BYTP-H&S-FOR-2115) avant toute reprise d'activité

5.3. Responsable Technique du projet

Le Responsable Technique du projet intervient principalement sur les imprévus de niveau 3, qui nécessitent une modification de la documentation technique. Ses responsabilités sont :

- Analyser l'impact de l'imprévu sur la documentation technique (dimensionnement, design, méthodes)
- Proposer et valider les modifications techniques nécessaires en coordination avec le Directeur/Responsable de projet
- Superviser la mise à jour des documents techniques avant la reprise d'activité

5.4. Responsable Prévention Santé Sécurité

Le Responsable Prévention du projet ou son équivalent (en cas d'absence d'un préventeur à temps plein) aide à la mise en place de la gestion de l'imprévu selon les modalités définies dans ce document sur le ou les projets à sa charge.

Ses responsabilités incluent :

- Aider le Directeur/Responsable de projet à mettre en place un processus de gestion des imprévus efficace
- Aider à la détection des imprévus
- Collaborer avec les valideurs pour assurer la bonne résolution des imprévus

- S'assurer que les actions mises en place respectent les exigences de sécurité et de prévention des risques

5.5. Tout personnel sur site

Tout employé présent sur le site a un rôle actif dans la prévention et la gestion des imprévus. Il doit :

- Détecter tout imprévu et prendre du recul sur son activité en cours
- Interrompre la tâche en cours si l'imprévu représente un risque
- Informer immédiatement le valideur concerné, en fonction du niveau d'impact

6. Étapes de la gestion de l'imprévu

6.1. Identification de l'imprévu

Le premier enjeu est la prise de conscience des intervenants qu'ils sont face à une situation qui sort du cadre prévu. Les questions suivantes doivent aider à identifier une telle situation d'imprévu :

Ressources humaines Je suis membre d'une équipe au complet et ayant les compétences nécessaires pour réaliser les tâches. Questions : 👍 L'équipe est au complet 🔍 Quelque chose me gêne 🚫 Un absent ? Problème de compétences ?	Tâches à exécuter Les tâches que je dois réaliser m'ont été expliquées et je les ai comprises. Questions : 👍 J'ai compris 🔍 Quelque chose me gêne 🚫 Je n'ai pas eu de briefing	Pilotage des travaux Je connais le planning des tâches à réaliser et les éventuelles co-activités prévues. Questions : 👍 Clair, défini et compris 🔍 Quelque chose me gêne 🚫 Co-activité imprévue ? Planning modifié ?
Logistique Les livraisons sur le chantier sont planifiées, je connais le planning et l'espace est disponible pour les réceptionner. Questions : 👍 Tout se passe comme prévu 🔍 Quelque chose me gêne 🚫 En retard ? Mal organisé ?	Matériel / engins J'ai à ma disposition le matériel en bon état dont j'ai besoin. Questions : 👍 En état et adapté 🔍 Quelque chose me gêne 🚫 Absent ou défectueux	Facteurs externes Je ne rencontre pas d'obstacles imprévus lors de la réalisation des travaux ni ne constate une dégradation des conditions météo. Questions : 👍 Rien à signaler 🔍 Quelque chose me gêne 🚫 Situation inattendue ? (météo, obstacle...)

Voir Annexe 1 - Dépliant unique de gestion de l'imprévu

Les imprévus n'étant pas tous de la même gravité, il convient de les caractériser pour les traiter au niveau approprié 1, 2 ou 3.

Lorsqu'un mode opératoire contient des points d'arrêts critiques ou des valeurs limites, une vérification régulière est nécessaire. Toute déviation sur ces valeurs doit être considérée comme un imprévu entraînant l'arrêt de l'activité et le signalement au valideur.

Lorsqu'un imprévu est identifié, l'intervenant concerné doit immédiatement arrêter l'activité en cours afin d'éviter toute aggravation de la situation et signaler l'événement au valideur de niveau 1 ou 2 de la zone concernée.

6.2. Sécurisation de la zone

Une fois l'imprévu identifié, l'activité est arrêtée et la zone est sécurisée si nécessaire pour éviter tout risque d'accident ou d'aggravation.

Le valideur concerné est immédiatement informé.

En cas de risque majeur, le Responsable Prévention Santé Sécurité doit également être consulté immédiatement.

6.3. Analyse collective

L'analyse doit être collaborative et réalisée dès que possible, avec la participation du ou des valideurs, des responsables concernés et du Responsable Technique du projet pour les imprévus de niveau 3.

Les solutions proposées doivent respecter :

- Les standards de santé et sécurité BYTP
- Les procédures spécifiques du projet
- Les exigences contractuelles et réglementaires du chantier

6.4. Niveaux de validation

Selon la nature et l'impact de l'imprévu, trois niveaux de validation des actions sont définis :

Niveau 1 : Imprévu sans impact sur les risques majeurs

- Validation par le valideur de niveau 1 désigné pour la zone concernée
- La reprise d'activité peut être décidée sans documentation formelle, sauf exigence spécifique du projet

Niveau 2 : Imprévu ayant un impact sur les risques majeurs ou un faible impact sur la documentation technique

- Validation par le valideur de niveau 2 désigné pour la zone concernée, en collaboration avec le Responsable Prévention Santé Sécurité
- La reprise d'activité peut être décidée sans documentation formelle, sauf exigence spécifique du projet

Niveau 3 : Imprévu ayant un impact conséquent sur la documentation technique (dimensionnement, conception, méthodes)

- Validation par le valideur de niveau 3, en collaboration avec le Responsable Technique du projet
- La résolution de l'imprévu nécessite une validation/approbation formelle par le Directeur/Responsable de projet
- Une traçabilité obligatoire est requise :
 - La *Fiche de déclaration de gestion de l'imprévu*, basée sur l'Annexe 3 - Fiche de suivi d'un imprévu de niveau 3, doit être complétée.

- La traçabilité est assurée dans un registre dédié du projet.

6.5. Mise en œuvre des actions

Une fois validées, les actions définies doivent être mises en œuvre sous la supervision des responsables d'exécution.

Le valideur concerné s'assure de l'application effective des actions décidées avant d'autoriser la reprise d'activité.

Un suivi post-mise en œuvre peut être nécessaire, notamment pour les imprévus de niveau 3, afin d'évaluer l'efficacité des mesures prises.

6.6. Communication

Les imprévus de niveau 2 et 3 survenus la veille doivent être systématiquement abordés lors des briefings de début de poste.

L'objectif de cette communication est de :

- Informer l'ensemble des équipes des imprévus rencontrés et des mesures mises en place.
- Sensibiliser les intervenants aux risques identifiés et aux leçons apprises.
- S'assurer de la bonne compréhension et de l'application des actions correctives pour éviter la récurrence de l'imprévu.

Le Responsable de poste ou le Responsable Prévention Santé Sécurité, si le projet en dispose d'un à temps plein, anime cette discussion en s'appuyant sur les retours des valideurs et des équipes opérationnelles.

Pour les imprévus de niveau 3, une communication renforcée peut être requise, incluant un retour d'expérience à diffuser aux parties prenantes du projet.

7. Archivage et traçabilité

Le projet archive les *fiches de suivi d'un imprévu* de niveau 3 et maintient à jour un registre associé pendant toute la durée du projet, sous la responsabilité du Directeur/Responsable de projet.

Après la fin du projet, les *Fiches de suivi d'un imprévu* de niveau 3 sont conservées durant toute la période de conservation des archives du chantier.

8. Annexes

8.1. Annexe 1 - Dépliant unique de gestion de l'imprévu

Personnes à CONTACTER

Je partage lors du prochain briefing !

Identifier un imprévu

AVANT DE DÉMARRER

- Je connais les travaux à effectuer
- Je connais les consignes à respecter
- J'ai contrôlé mon matériel et l'environnement

PENDANT LES TRAVAUX

- Je ne me mets pas en danger
- J'observe si mes collègues ne se mettent pas en danger
- Je détecte toute situation inhabituelle ou non prévue

Ressources humaines

Je suis membre d'une équipe au complet et ayant les compétences nécessaires pour réaliser les tâches.

Questions :

- ✓ L'équipe est au complet
- ⚠ Quelque chose me gêne
- ⚠ Un absent ? Problème de compétences ?

Logistique

Les livraisons sur le chantier sont planifiées, je connais le planning et l'espace est disponible pour les réceptionner.

Questions :

- ✓ Tout se passe comme prévu
- ⚠ Quelque chose me gêne
- ⚠ En retard ? Mal organisé ?

Tâches à exécuter

Les tâches que je dois réaliser m'ont été expliquées et je les ai comprises.

Questions :

- ✓ J'ai compris
- ⚠ Quelque chose me gêne
- ⚠ Je n'ai pas eu de briefing

Matériel / engins

J'ai à ma disposition le matériel en bon état dont j'ai besoin.

Questions :

- ✓ En état et adapté
- ⚠ Quelque chose me gêne
- ⚠ Absent ou défectueux

Pilotage des travaux

Je connais le planning des tâches à réaliser et les éventuelles co-activités prévues.

Questions :

- ✓ Clair, défini et compris
- ⚠ Quelque chose me gêne
- ⚠ Co-activité imprévue ? Planning modifié ?

Facteurs externes

Je ne rencontre pas d'obstacles imprévus lors de la réalisation des travaux ni ne constate une dégradation des conditions météo.

Questions :

- ✓ Rien à signaler
- ⚠ Quelque chose me gêne
- ⚠ Situation inattendue ? (météo, obstacle...)

Gérer collectivement l'imprévu en toute Sécurité

👍 JE POURSUIS L'ACTIVITÉ

❓ JE VAIS CHERCHER LES INFORMATIONS

🛑 NOUS AVONS UN IMPRÉVU (ALLER AU VERSO)

🔊

SAFETY CULTURE

Ensemble, nous gérons l'I.M.P.R.É.V.U collectivement en toute sécurité !

1 IDENTIFIER

- Nous détectons un événement imprévu à l'aide des conseils figurant sur le recto de ce flyer

2 MAÎTRISER / PROTÉGER

- Je me protège et je protège les autres
- Nous mettons en sécurité la zone / l'espace

3 RÉFLÉCHIR

Nous réfléchissons ensemble à une solution conforme aux Règles Vitales

4 ÉCHANGER

- Je ne prends jamais de décision seul, quel que soit mon poste dans l'organisation
- Nous contactons toujours les « personnes à CONTACTER » pour alerter/partager la solution que nous imaginons

5 VALIDER

- Nous attendons la validation finale avant de reprendre les travaux

6 UNANIME

- Nous sommes tous informés des solutions trouvées
- La reprise des travaux se fait en toute sécurité

10 RÈGLES VITALES COMME ULTIME BARRIÈRE POUR ÉVITER UN ACCIDENT

- ✓ Je m'assure que la charge à lever est monobloc
- ✓ Je ne me positionne pas sous la charge ou entre celle-ci et un obstacle, au départ et à l'arrivée d'une opération de levage
- ✓ J'utilise des accessoires de levage vérifiés et adaptés à la charge
- ✓ Je ne pénètre pas dans une zone d'exclusion

- ✓ Je respecte les voies de circulation dédiées aux engins et aux piétons
- ✓ Je ne pénètre pas dans la zone de travail d'un engin sans l'accord du conducteur de cet engin
- ✓ Je ne pénètre pas dans une zone d'exclusion

- ✓ Je ne m'expose pas au vide sans protection contre le risque de chute, et je protège les ouvertures que je crée
- ✓ Je ne pénètre pas dans une zone d'exclusion


- ✓ Je stabilise à tout moment les matériaux, matériels, engins et équipements et je m'assure qu'ils reposent sur un support résistant
- ✓ Je ne pénètre pas dans une zone d'exclusion

- ✓ J'utilise une machine ou un outil adapté et je ne shunte pas ses systèmes de sécurité
- ✓ Je ne pénètre pas dans une zone d'exclusion

- ✓ Je vérifie l'absence d'énergies avant toute intervention sur des réseaux ou sur des machines de production
- ✓ Je ne pénètre pas dans une zone d'exclusion

8.2. Annexe 2 - Poster de gestion de l'imprévu nominatif

LA GESTION DES IMPRÉVUS SUR NOTRE CHANTIER

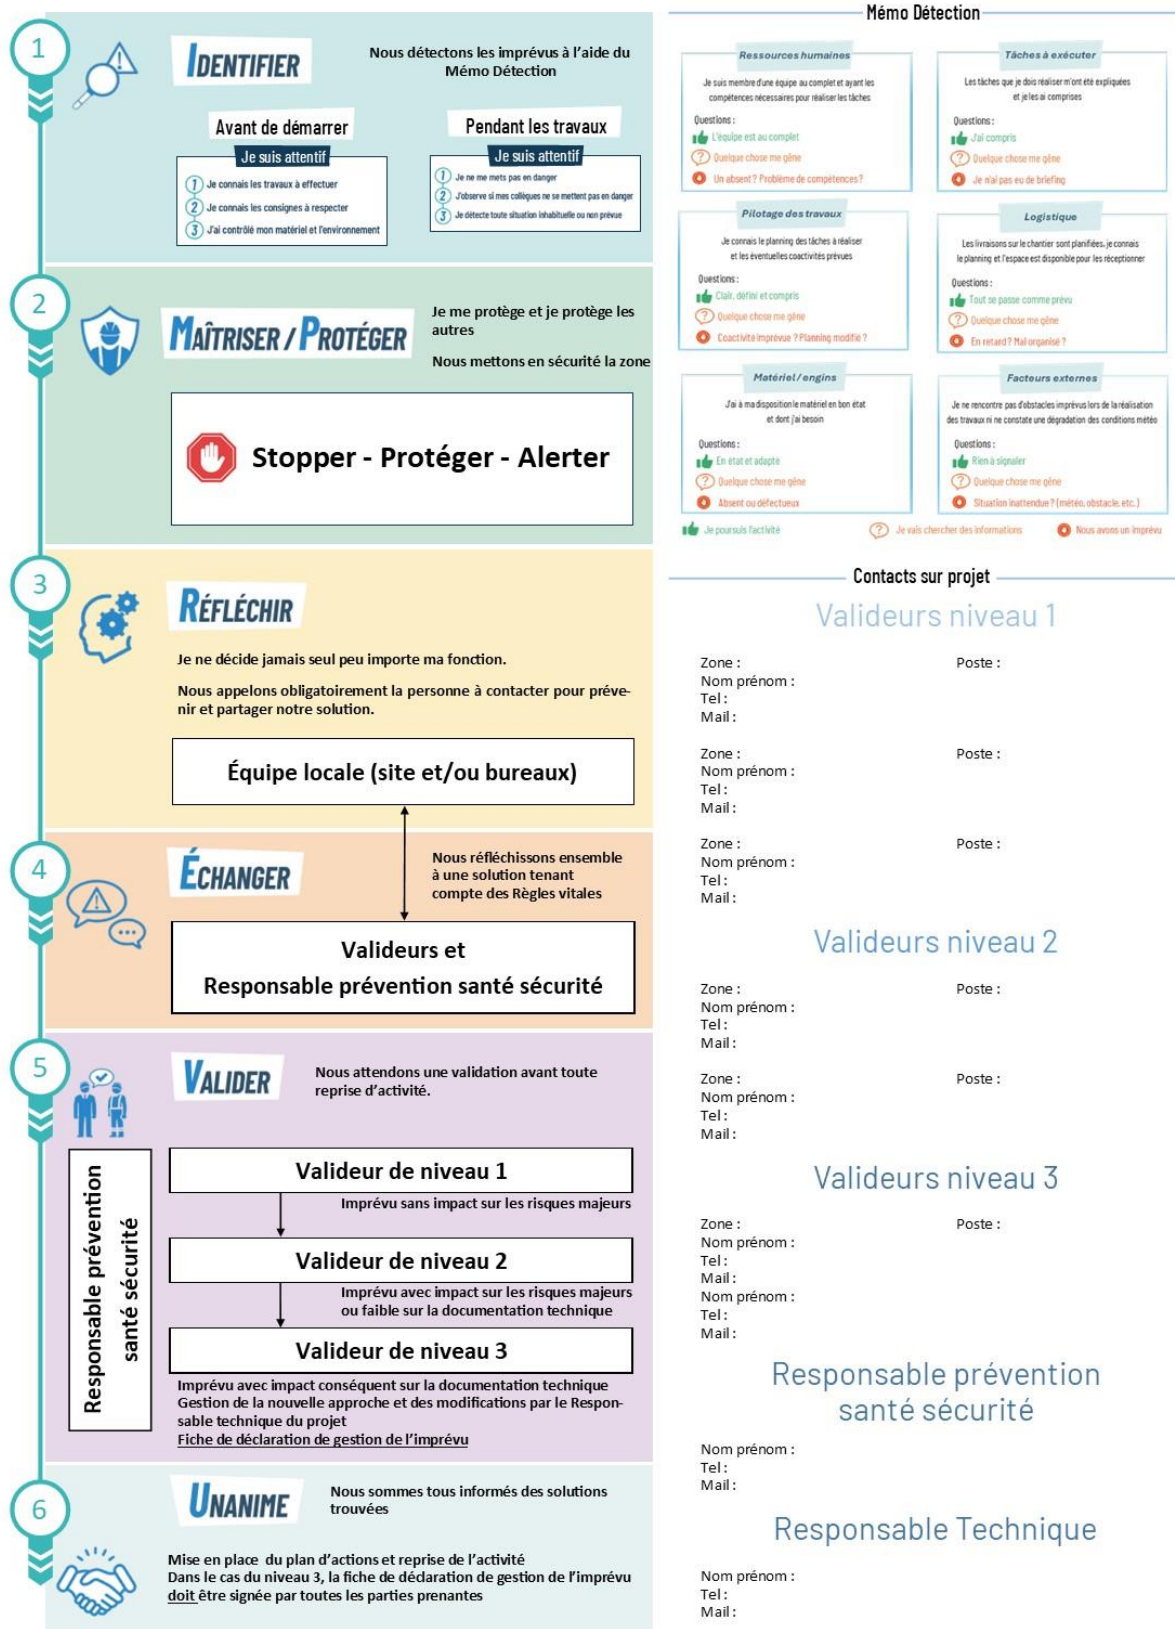

8.3. Annexe 3 – Fiche de suivi d'un imprévu de niveau 3



NOM DU MANDATAIRE / GROUPEMENT
NOM DU PROJET

LOGO DU PROJET

FICHE DE DÉCLARATION DE GESTION D'IMPRÉVUS				
Numéro de référence documentaire			Date :	
Chantier : Demandeur : Position :		Date : Signature :		
<u>Intitulé du changement :</u>				
<u>Description :</u>				
<u>Demande de changements :</u>				
<u>Liste des documents modifiés :</u>				
<u>Liste des documents créés :</u>				
En validant cette déclaration de gestion de l'imprévu, je confirme que la documentation est mise à jour selon les détails mentionné ci-dessus, qu'une analyse de risque a été réalisée selon ces nouvelles conditions d'opérations et que les activités associées peuvent reprendre selon cette nouvelle configuration :				
Nom du Directeur de projet* :			Signature :	
Date :				
L'activité n'est autorisée à démarrer que si tous les éléments sont conformes au plan d'action prévu et sous la responsabilité du Directeur de projet.				
Prise de connaissance de la validation de cette déclaration de gestion de l'imprévu et de la documentation associée par :**				
Responsable prévention santé sécurité	Responsable de production	Responsable maîtrise	Chef de chantier	Chef d'équipe
Nom	Nom	Nom	Nom	Nom
Date	Date	Date	Date	Date
Signature	Signature	Signature	Signature	Signature

*Pour les grands projets et en fonction de l'organisation en place, le Directeur/Responsable projet peut, s'il le souhaite, déléguer à sa ligne managériale ses responsabilités de valideur

**L'ensemble des signatures doivent être collecter pour relancer l'activité.



Fiche de déclaration de gestion d'imprévus
BYTP-FOR-H&S-2115-vA | 21-03-2025
Page 1 sur 1

